

OE c5.1 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : c5 — Recevoir des mandats supplémentaires et des modifications et les documenter	OE traité : c5.1
Énoncé officiel : Ils décrivent le déroulement d'un projet.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 5 périodes (1re année)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **c5.1 — Ils décrivent le déroulement d'un projet — Taxo C2 — Lieu EP**

→ **Cette fiche développe uniquement : c5.1 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous intervenez, dans le cadre de votre apprentissage, sur un chantier pour Delta Elec Sàrl, votre entreprise formatrice. Le propriétaire d'un petit immeuble locatif à Lausanne souhaite remplacer l'éclairage vétuste de la cage d'escalier et des paliers (tubes fluorescents) par un nouvel éclairage LED équipé de détecteurs de présence.


Les travaux sont prévus dans trois semaines, pendant que l'immeuble reste occupé — il faut donc limiter la gêne pour les locataires. Le groupe luminaires existant devra être coupé pendant les travaux : il faudra prévoir un éclairage provisoire pour garantir la sécurité de circulation des locataires. Avant de commencer le câblage, votre chef d'équipe vous demande d'organiser le déroulement de ce petit projet.

[Photo cages d'escalier avant]

[contenu généré par l'IA]



[Photo cages d'escalier avant]

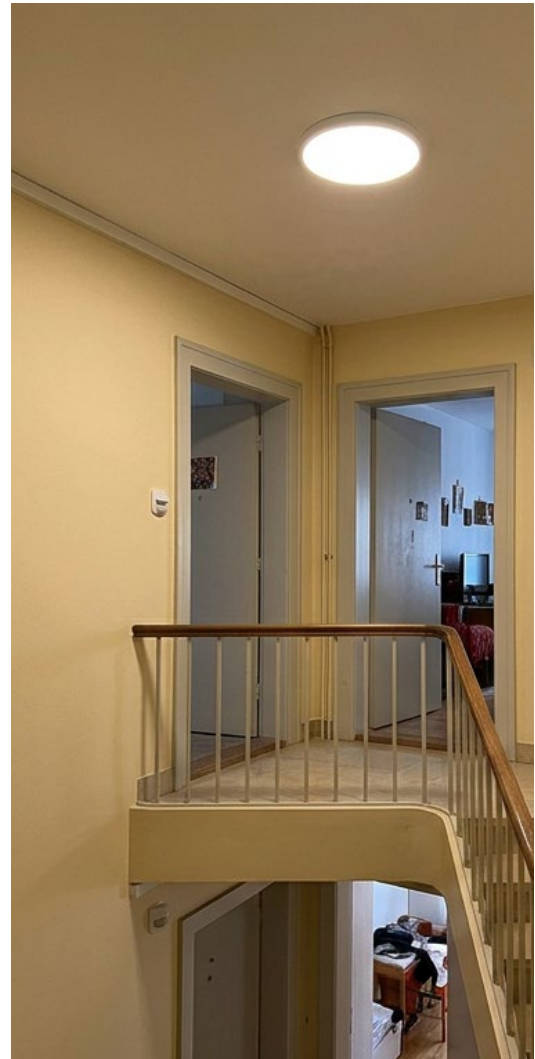

Mandat

Vous devez élaborer le déroulement du projet de remplacement de l'éclairage de la cage d'escalier, en identifiant les étapes principales, les délais, les responsabilités de chacun·e, la liste des pièces nécessaires et la solution d'éclairage provisoire pendant la coupure du circuit définitif.

Livrables attendus

- ☐ Un calendrier simple du projet (étapes principales, délais, au moins un jalon)
- ☐ Un tableau de répartition des responsabilités (qui fait quoi)
- ☐ Une liste de pièces nécessaires au chantier (luminaires, détecteurs, matériel de pose)
- ☐ Une solution d'éclairage provisoire pendant la coupure du groupe luminaires existant (raccordement provisoire)

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Décrire les trois phases du déroulement d'un projet : planification, mise en œuvre, achèvement
- Expliquer le rôle du cahier des charges dans un projet
- Établir un calendrier simple avec délais et jalons pour un petit chantier
- Répartir les responsabilités des personnes impliquées dans un projet (structure de répartition du travail)
- Élaborer une liste de pièces pour un projet d'installation d'éclairage
- Anticiper les besoins provisoires (ex. éclairage de chantier) pendant la mise en œuvre, lorsqu'un circuit existant doit être coupé
